

ASFINAG BMG

DIGITALISIERUNG

MKF

14.11.2022




exakt
BMG PROJEKTPLATTFORM

A|S|F|i|N|A|G
GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!


ANFORDERUNGEN

- 📍 Abwicklung der inhaltlichen Prüfung von Minder- oder Mehrkostenforderungen entsprechend der geltenden Rechtsnormen
- 📍 Insbesondere für Bauleistungen
- 📍 Nachfolgender Änderungsauftrag -> Provia

 Bestellungen

→ MKF einmelden, prüfen, freigeben

ABLAUF

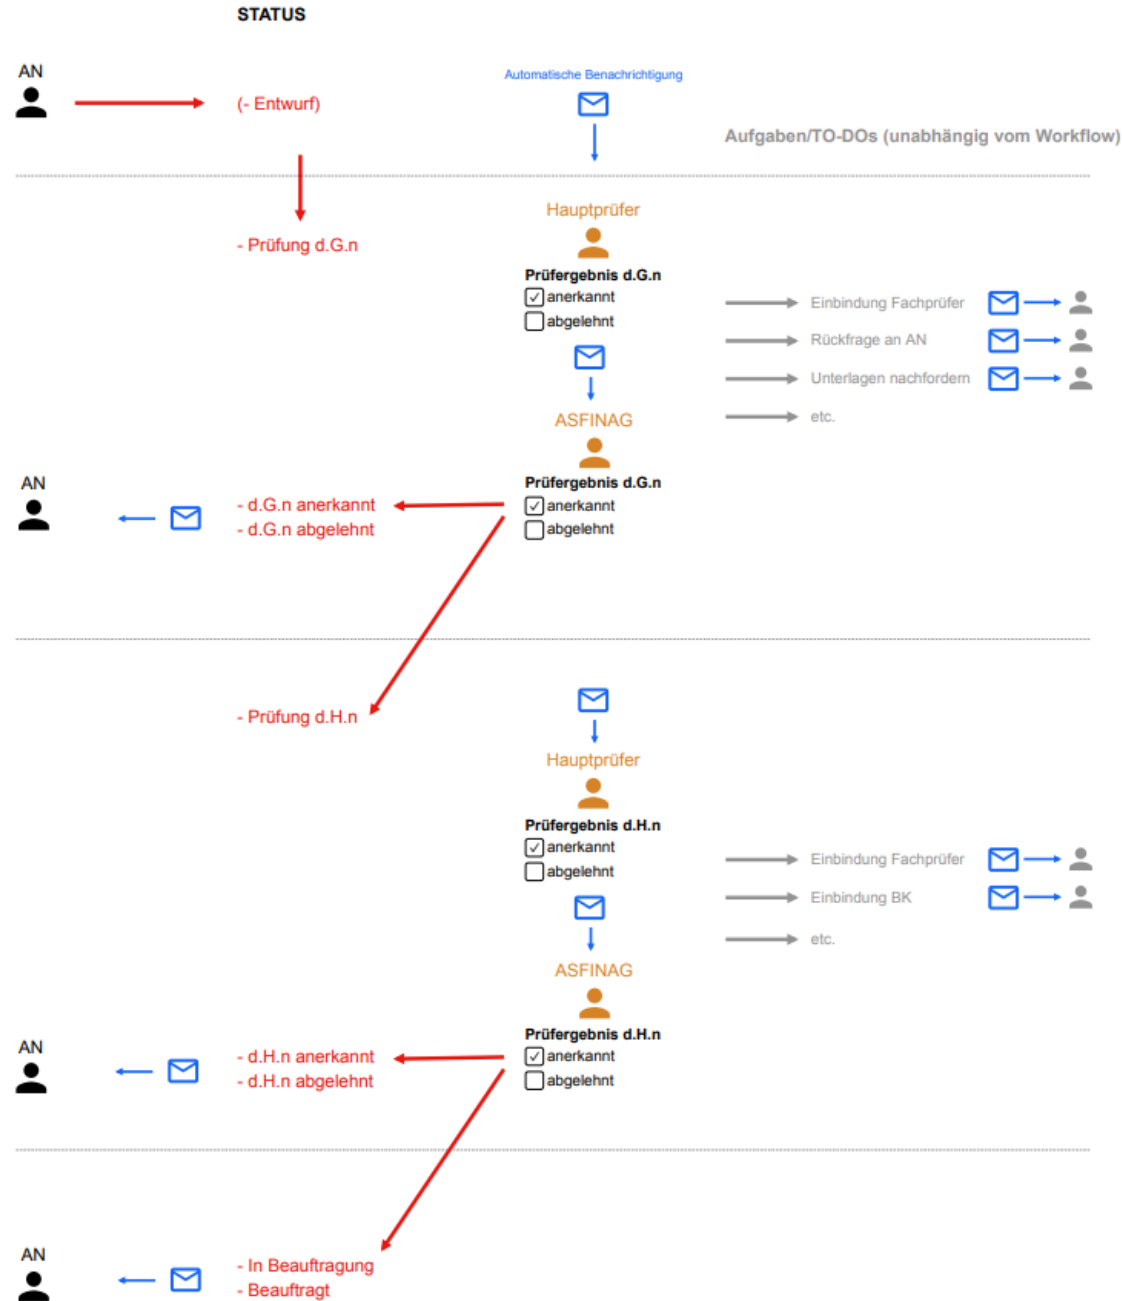

BESTELLUNGEN: MKF-ÜBERSICHT

|
 |
 |
 |
 |

Hauptauftragssumme: 15 880 416,08 €
 Fortgeschriebene Auftragssumme: 16 200 075,01 €
 Stand der Abrechnung: 18 851 515,59 €

| <input type="checkbox"/> | | Name | Titel | Status | | Eingereicht d. G. n. | Eingereicht d. H. n. | | Geschätzte Kosten | Einreich |
|-----------------------------|--|---------|---|---------------------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|
| △ Prüfung dem Grunde nach | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-010 | MKF 10 - Zusatzmaßnahme Brücke innerhalb der garantierten Angebotssumme | Prüfung dem Grunde nach | | 22.03.2022 | 22.03.2022 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-012 | Lieferengpässe und Preissteigerungen auf Grund Ukrainekrieg | Prüfung dem Grunde nach | | 19.07.2022 | | | | |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | 0,00 | |
| △ Dem Grunde nach abgelehnt | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-011 | MKF11 - Covid19 Maßnahmen lt. Verordnung vom 15.11.2021 | Dem Grunde nach abgelehnt | | 22.03.2022 | 22.03.2022 | | 0,00 | |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | 0,00 | |
| △ Prüfung der Höhe nach | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-001 | MKF01 - Covid 19 - Außerhalb der Garantiesumme | Prüfung der Höhe nach | | 02.12.2021 | 19.07.2022 | | 513 053,05 | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-008 | MKF 08 - Mehrmassen Bewehrung sowie Muffen a.d.g.A. | Prüfung der Höhe nach | | 22.03.2022 | 22.03.2022 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-013 | Massenmehrung Muffen a.d.g.A | Prüfung der Höhe nach | | 19.07.2022 | 19.07.2022 | | | |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | 513 053,05 | |
| △ Beauftragt | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | MKF-002 | MKF 02 - Bodenauswechslung und Stabilisierung Baustraßen | Beauftragt | | 22.03.2022 | 22.03.2022 | | 0,00 | |

WEITERE FUNKTIONALITÄTEN

- Berechtigungen
- Entwurfsfunktion
- Fristaussetzungen
- Sonderstatus
- Berichte: PSS-Protokoll, MKF-Prüfbericht, ...

EXAKT.ASFINAG.AT

asfinag.at



A|S|F|i|N|A|G
GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!
