

Datenträgererstellung
von Mengenänderungen aus Mehrkostenforderungen
im ABK
gem. Abrechnungsleitfaden LF_038

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	2
1.1	Neue Positionen.....	2
1.2	Mengenänderungen.....	2
2	Grundlegende Einstellungen.....	3
2.1	Allgemein.....	3
2.1.1	Kontrolle LV-Art (Phase).....	3
2.1.2	Eingabe „Auftragscode“ und „LV-Code“.....	4
3	MKF Leistungsverzeichnis erstellen.....	5
3.1	Allgemeine Einstellungen.....	5
3.2	Mehrkostenforderung erstellen.....	6
3.2.1	Zusatzauftrag importieren.....	7
3.2.2	Zusatzauftrag (manuell) anlegen.....	9
4	„Status“ von Zusatzaufträgen.....	16
4.1.1	Bedeutung von „Status“ für Abrechnungsprüfung.....	16
4.1.2	Änderung des „Status“ von einzelnen Zusatzauftragspositionen bzw. ganzen Zusatzaufträgen.....	16
4.1.2.1	Gesamtheitliche Änderung des „Status“ eines Zusatzauftrags.....	16
4.1.2.2	Änderung des „Status“ auf Positionsebene für ZA-Positionen.....	17
5	MKF-Datenträger erstellen/exportieren.....	18

1 Vorbemerkungen

Der Asfinag Leitfaden LF_038 regelt, in welcher Form Mehrkostenforderungen in die Abrechnung einzugliedern sind.

Seitens der ÖBA ist ein ÖNORM-Datenträger inklusive Preisgleitungszuordnung der Leistungspositionen zu erstellen und im Zuge des Änderungsauftrages an alle Projektbeteiligten (AN, PL, BK, etc.) zu verteilen. Er hat die zusätzlichen und geänderten Positionen sowie die entfallenden Positionen und Mengenminderungen / -mehrungen zu enthalten.

1.1 Neue Positionen

Die Gliederung ist entsprechend dem Hauptauftrag nach Leistungsgruppen inkl. Positionslangtext durchzuführen.

LV Struktur Hauptauftrag MIT Hauptgruppen

HG	OG	LG	Pos.Nr.	
80				Vertragsanpassung, Mehrkostenforderung
	24			Nummer der Mehrkostenforderung (Bsp. MKF 24)
		06		gem. LB-VI, LB TI... (Bsp. LB-VI 05 Vor-,Abtrags- und Erdarbeiten)
			2511A	gem. LB-VI, LB TI... (Bsp. LB-VI 05 Leichter-schwerer Boden 3-5 laden)

LV Struktur Hauptauftrag OHNE Hauptgruppen

	OG	LG	Pos.Nr.	
				Vertragsanpassung, Mehrkostenforderung
	82			Nummer der Mehrkostenforderung (Bsp. MKF 02)
		06		gem. LB-VI, LB TI... (Bsp. LB-VI 05 Vor-,Abtrags- und Erdarbeiten)
			2511A	gem. LB-VI, LB TI... (Bsp. LB-VI 05 Leichter-schwerer Boden 3-5 laden)

1.2 Mengenänderungen

Die Mengenfortschreibung von Leistungspositionen aus Mehr-/Minderkostenforderungen hat bei der entsprechenden Hauptauftrag-LV-Position zu erfolgen.


Dazu zählen

- Entfallene Positionen
- Mengenmehrungen von Positionen
- Mengenminderungen von Positionen

Diese so genannte „erweiterte Nachtragsverwaltung“ wird in den folgenden Punkten für das Programm „ABK“ genauer beschrieben.

2 Grundlegende Einstellungen

Diese werden unter „AVA-AG“ -> „BA“ (Bauabrechnung) definiert.

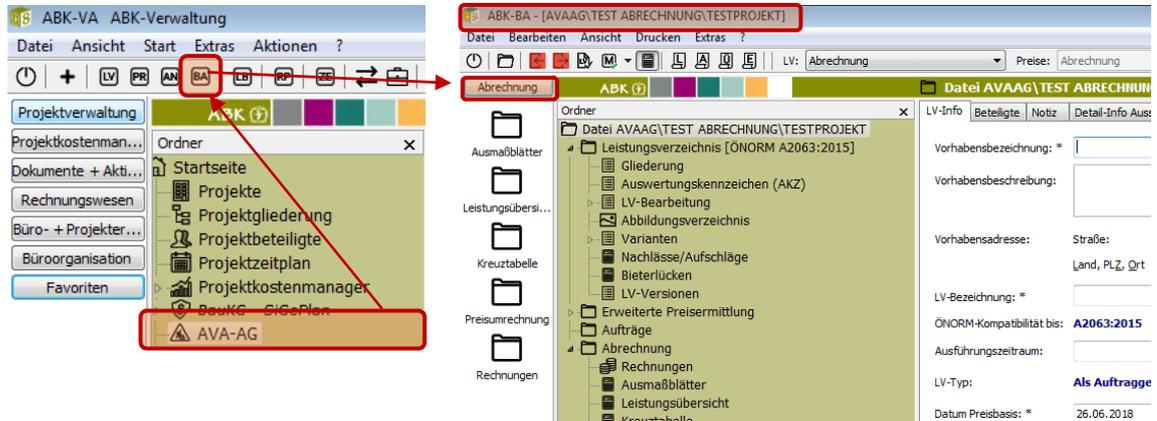


2.1 Allgemein

Die allgemeinen Einstellungen werden im Ordner „Datei AVVAG\.....“ getätigt.

2.1.1 Kontrolle LV-Art (Phase)

Um „neue“ Positionen im Leistungsverzeichnis (LV) anlegen zu können, muss die **LV-Art** auf **Abrechnungs-LV** eingestellt werden (Phase „**Abrechnung kontrollieren**“).

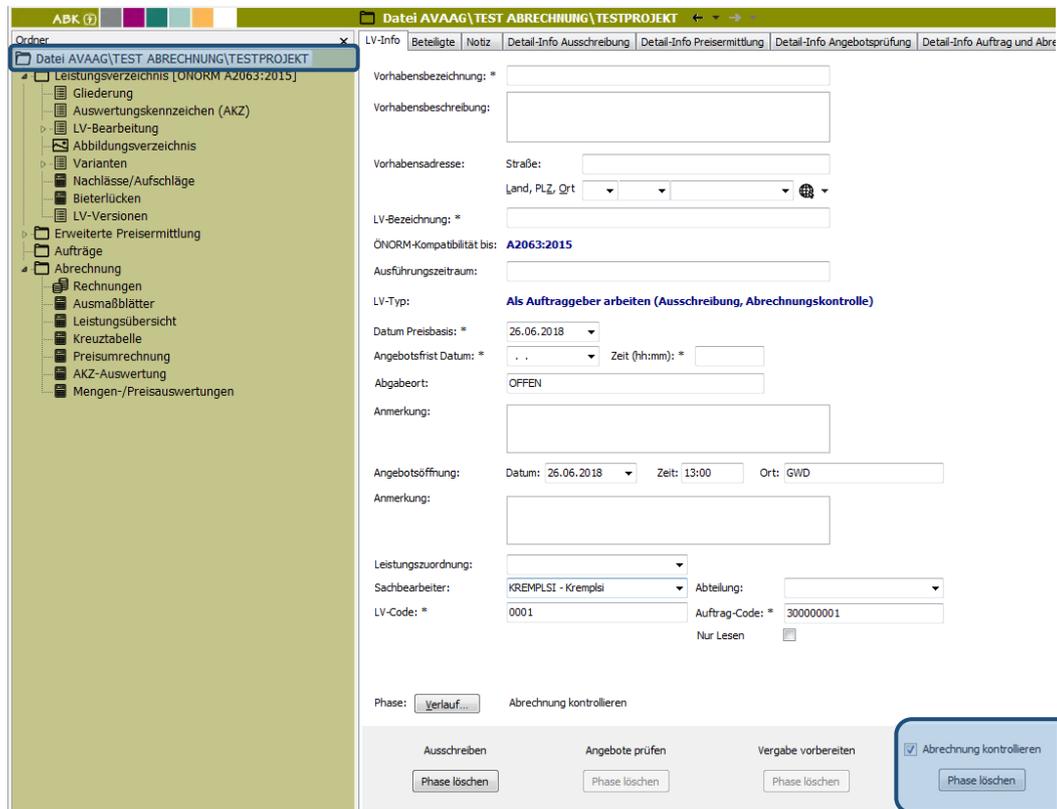

2.1.2 Eingabe „Auftragscode“ und „LV-Code“

Um Fehlermeldungen beim Export/Import zu vermeiden, ist es erforderlich, im Registerblatt „LV-Info“ den „Auftragscode“ und „LV-Code“ einmalig einzugeben.

Der Auftragscode soll **vor Beginn der Abrechnung einvernehmlich** zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und ÖBA (z. B. im Rahmen des Abrechnungsstartgesprächs) festgelegt werden.

***Empfehlung Team Abrechnung:** Die Bestellnummer als Auftragscode wählen. Sofern noch kein LV-Code enthalten ist, muss auch dieser vor Beginn der Abrechnung einvernehmlich zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und ÖBA festgelegt werden. Entweder Kurzbezeichnung des Bauvorhabens oder ebenfalls die Bestellnummer als LV-Code wählen.*

Ordner x LV-Info | Beteiligte | Notiz | Detail-Info Ausschreibung | Detail-Info Preisermittlung | Detail-Info Angebotsprüfung | Detail-Info Auftrag und Abre

Ordner
Datei AVAAG\TEST ABRECHNUNG\TESTPROJEKT
Leistungverzeichnis [ONORM A2063:2015]
Gliederung
Auswertungskennzeichen (AKZ)
LV-Bearbeitung
Abbildungsverzeichnis
Varianten
Nachlässe/Aufschläge
Bieterlücken
LV-Versionen
Erweiterte Preisermittlung
Aufträge
Abrechnung
Rechnungen
Ausmaßblätter
Leistungsübersicht
Kreuztabelle
Preisumrechnung
AKZ-Auswertung
Mengen-/Preisbewertungen

Vorhabensbezeichnung: *
Vorhabensbeschreibung:
Vorhabensadresse: Straße:
Land, PLZ, Ort:
LV-Bezeichnung: *
ÖNORM-Kompatibilität bis: **A2063:2015**
Ausführungszeitraum:
LV-Typ: **Als Auftraggeber arbeiten (Ausschreibung, Abrechnungskontrolle)**
Datum Preisbasis: * 26.06.2018
Angebotsfrist Datum: * . . Zeit (hh:mm): *
Abgabeort: OFFEN
Anmerkung:
Angebotsöffnung: Datum: 26.06.2018 Zeit: 13:00 Ort: GWD
Anmerkung:
Leistungszuordnung:
Sachbearbeiter: KREMPLSI - Kremplsi Abteilung:
LV-Code: * 0001 Auftrag-Code: * 300000001
Nur Lesen
Phase: Verlauf... Abrechnung kontrollieren
Ausschreiben Angebote prüfen Vergabe vorbereiten Abrechnung kontrollieren
Phase löschen Phase löschen Phase löschen Phase löschen

3 MKF Leistungsverzeichnis erstellen

3.1 Allgemeine Einstellungen

Bevor ein neuer Zusatzauftrag angelegt werden kann, muss zunächst die HG und OG für „neue Positionen“ (siehe Punkt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) in der LV-„Gliederung“ angelegt werden.

HG	OG	Bezeichnung	LB-Kennung	LB-Stru.	A/N-Verf.	Ohne LB
00		ASFINAG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00	00	ASFINAG - Bestimmungen	B-011	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01		ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	01	BE+REGIEN	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	04	LEITEINRICHTUNGEN	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	05	Kampfmittelerkundung	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02		KUNSTBAUTEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	01	Brücke 1	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	02	Brücke 2	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03		STRASSENBAU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	01	Haupttrasse, Nebenwege	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	02	Gewässerschutzanlagen	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		CNAS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	01	CN.as-Linie	TI-003	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mit dem Button „+“ ist die neue HG 80 und anschließend die OG gemäß MKF-Nummer anzulegen.

HG	OG	Bezeichnung	LB-Kennung	LB-Stru.	A/N-Verf.	Ohne LB
00		ASFINAG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00	00	ASFINAG - Bestimmungen	B-011	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01		ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	01	BE+REGIEN	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	04	LEITEINRICHTUNGEN	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	05	Kampfmittelerkundung	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02		KUNSTBAUTEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	01	Brücke 1	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	02	Brücke 2	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03		STRASSENBAU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	01	Haupttrasse, Nebenwege	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	02	Gewässerschutzanlagen	VI-004	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		CNAS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	01	CN.as-Linie	TI-003	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80		Mehr-/Minderkostenforderungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	01	MKF 01	HB-020	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	02	MKF 02	HB-020	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In der Spalte „LB-Kennung“ kann nachträglich die Standard-Leistungsbeschreibung (LB) geändert werden.

Dazu die Zelle mit der zu ändernden LB markieren und entweder mit dem Button „LB“ oder über die rechte Maustaste „LB Zuordnung ändern“ auswählen und die gewünschte LB bestätigen.

80		Mehr-/Minderkostenforderungen				
80	01	MKF 01	HB-020	2021		
80	02	MKF 02	HB-020			

80		Mehr-/Minderkostenforderungen				
80	01	MKF 01	TI-003	2021		
80	02	MKF 02	VI-004	2021		

- + Neu (Einfg)
- Löschen (Entf)
- Umbenennen... (Strg+U)
- Suchen... (Strg+F)
- Spaltenauswahl/Layout anpassen... (Alt+F10)
- Gliederungsschema ändern...
- LB Zuordnung ändern...**
- OG mit gleicher LB zusammenfassen

3.2 Mehrkostenforderung erstellen

Im Ordner/Register „Aufträge“ werden alle Aufträge des Abrechnungsprojektes aufgelistet. „HA“ stellt dabei immer den Hauptauftrag dar.

Auftragsnummer	Status	Datum	Nummer Rechnunsw.	Auftragsbezeichnung
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt

Anmerkung: Um eine fehlerfreie und problemlose Bearbeitung der Zusatzaufträge im ABK sicherzustellen, ist es erforderlich, dass die Zusatzaufträge lückenlos fortlaufend nummeriert angelegt werden.

Liegt wie im nachfolgend dargestellten Beispiel keine lückenlose Nummerierung der ZA vor, so kann „manuell“ kein ZA mit einer niedrigeren Nummer neu angelegt werden. Im u. a. Beispiel können die ZA 003 & 004 nicht mehr im Nachgang angelegt werden, sondern es wird vom Programm automatisch die nächste Nummer, sprich ZA006, vergeben.

In diesem Fall empfiehlt es sich zwischenzeitlich einen „leeren“ Zusatzauftrag mit der entsprechenden Nummer anzulegen und diesem den Status „abgelehnt“ zuzuordnen.

Beispiel: lückenhafte ZA-Nummerierung

Auftragsnummer	Status	Datum	Nummer Rechnunsw.	Auftragsbezeichnung
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt
ZA 001	Beantragt	19.07.2019		MKF01
ZA 002	Beantragt	19.07.2019		MKF02
ZA 005	Beantragt	07.08.2019		MKF05

Das Einlesen eines ÖNorm-Datenträgers (*.onlv-Datei) für Zusatzaufträge mit niedrigeren Nummern ist auch im Nachhinein noch möglich. Für das konkrete Beispiel bedeutet das, dass ÖNorm-Datenträger für die ZA 003 & 004 sehr wohl noch eingelesen werden können.


3.2.1 Zusatzauftrag importieren

Im Ordner/Register „Aufträge“ können die als ÖNorm-Datenträger (*.onlv-Datei) vorliegenden bzw. übergebenen Zusatzaufträge importiert werden.

Dazu entweder über den Button „+“ oder über die rechte Maustaste „Auftrag importieren“ auswählen.



Im nachfolgend aufgehenden Fenster über den Button  oder  den ÖNorm-Datenträger des Zusatzauftrags suchen & öffnen und anschließend mittels „Weiter >“ fortfahren und einlesen.

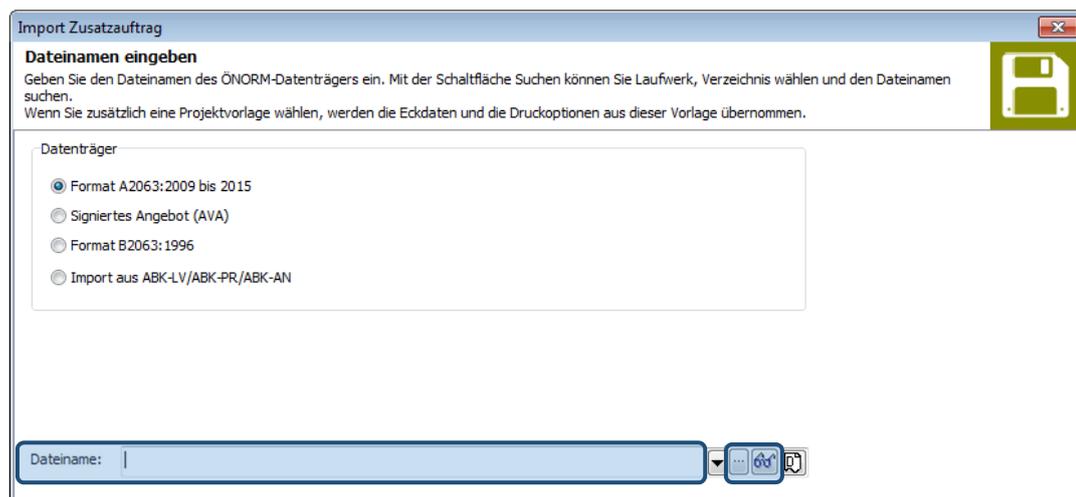

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ABK-TEST MKF-ZA001	07.08.2019 15:43	A2063 Leistungsve...	47
TEST-MKF	07.08.2019 11:50	A2063 Leistungsve...	43

Leistungsverzeichnis (ÖNORM)

Öffnen Abbrechen

Im anschließend aufgehenden Fenster „Import Zusatzauftrag“ kann nochmals überprüft werden, ob

- es sich bei der „LV-Art“ um ein „Zusatzangebots-LV“ handelt.
- die „Zusatzauftragsnummer“ korrekt ist.
- der „Auftrag-Code“ und „LV-Code“ übereinstimmen.

Import Zusatzauftrag

Einstiegsprüfung
Überprüfen Sie die unten angezeigten Informationen, und klicken Sie auf "Weiter".

Zusatzauftragsnummer: **001**

Normformat: **ÖNORM A2063 Ausgabe 2009-06-01**
Dateiname: **\\Client\IS**
Originaldateiname: **ABK-TEST MKF-ZA001.onlv**
Erstellt am: **07.08.2019, 15:43:20**
Programmsystem / Version: **ABKB-BA (www.abk.at) / V8.0b-8918-hf**

LV-Gliederung: **LV mit Gliederung (HG)**
LV Art: **Zusatzangebots-LV**
Preisanteile: **2**

LV-Code: **1**
Vorhaben: **Testprojekt ABK**
LV-Bezeichnung: **Test-LV**
Auftrag-Code: **300000001**


LV-Ersteller: **Kontaktperson: Kremplsi;**
Auftraggeber: **Firma: ASFINAG**
Vergabende Stelle: **Firma: ASFINAG**
Bieter/Auftragnehmer: **Firma: ASFINAG**

XML-Schemaprüfung: **OK**


Als E-Mail senden... Kopieren in Zwischenablage

< Zurück Weiter > Abbrechen

Mit „Weiter >“ kommt man zur Abfrage der LB-Zuordnung für die Zusatzauftrags-Positionen.



Mit „Weiter >“ und „Starten >“ wird der Zusatzauftrag schließlich importiert und befindet sich automatisch im Status „beantragt“.




Zur Änderung des „Status“ von gesamten Zusatzaufträgen bzw. einzelnen ZA-Positionen siehe Punkt 4.

3.2.2 Zusatzauftrag (manuell) anlegen



Wenn durch den Zusatzauftrag auch „neue“ MKF-Positionen [siehe Punkt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** - HG 80 (LV Struktur Hauptauftrag MIT HG) bzw. OG 8x (LV Struktur Hauptauftrag OHNE HG)] erfasst werden, ist es erforderlich, im Register „Leistungsverzeichnis“ -> Unterordner „Gliederung“ die HG bzw. OG inklusive LB-Zuordnung für den Zusatzauftrag anzulegen (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Beispiel: MKF 02 bei LV Struktur Hauptauftrag MIT Hauptgruppen

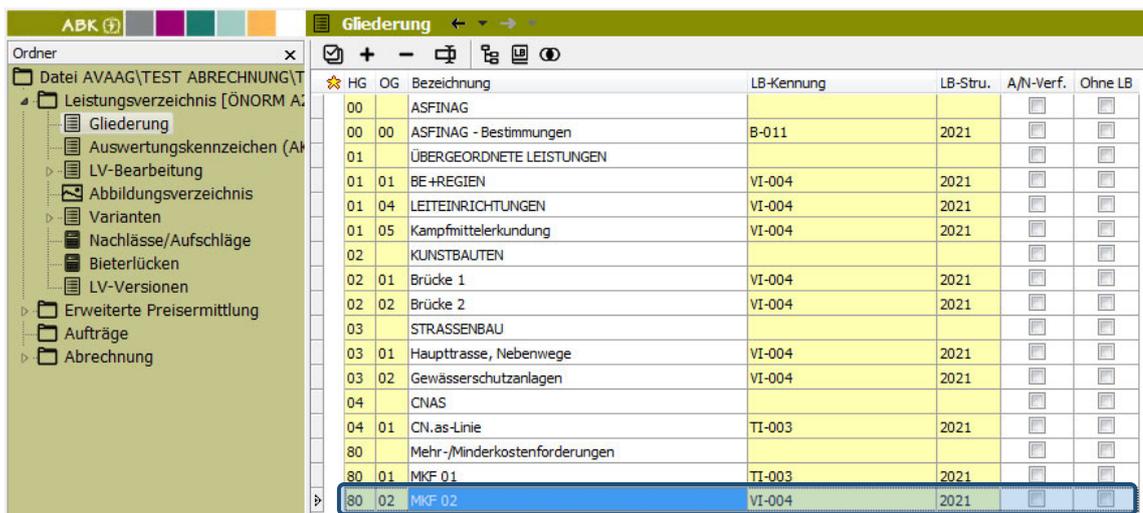

Wenn durch den Zusatzauftrag nur Mengenmehrungen/-minderungen von Hauptauftragspositionen betroffen sind (siehe Punkt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), kann dieser Schritt entfallen und direkt wie nachfolgend beschrieben, der Zusatzauftrag im Register „Aufträge“ angelegt werden.


Das Anlegen eines neuen Zusatzauftrags erfolgt im Register „Aufträge“ mit dem Button „+“ oder rechter Maustaste „+ Neu“ und der Auswahl „Neuen Auftrag anlegen“.

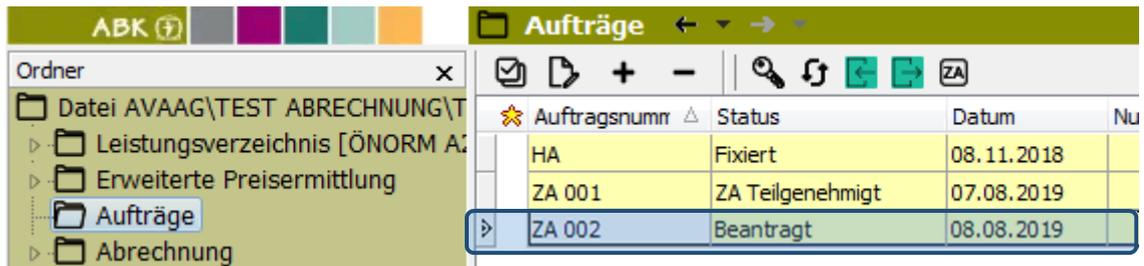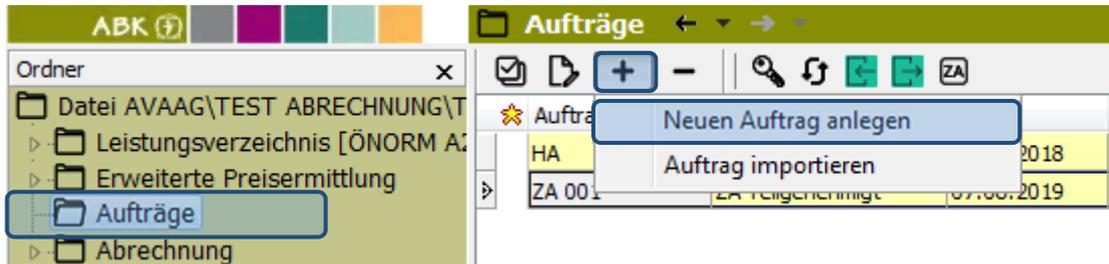

Der neu angelegte Zusatzauftrag befindet sich zunächst automatisch im Status „beauftragt“. Zur Änderung des „Status“ von gesamten Zusatzaufträgen bzw. einzelnen ZA-Positionen siehe Punkt 4.

Nachdem der neue Zusatzauftrag angelegt ist, kann man ins Register „Leistungsverzeichnis“ -> Unterordner „LV-Bearbeitung“ wechseln und dort die „neuen“ Positionen bzw. Mengenerhöhungen/-minderungen von Hauptauftragspositionen für den Zusatzauftrag erfassen.

Beispiel: Erfassen von Mengenerhöhungen/-minderungen von Hauptauftrags-LV-Positionen
Dazu wählt man im LV die entsprechende Position aus und gelangt durch „Doppelklick“ in das Fenster „Positionseigenschaften“. In diesem kann mit dem Button „+“ eine neue Zeile für den Zusatzauftrag angelegt werden, in der die Differenzmenge eingeben werden kann.

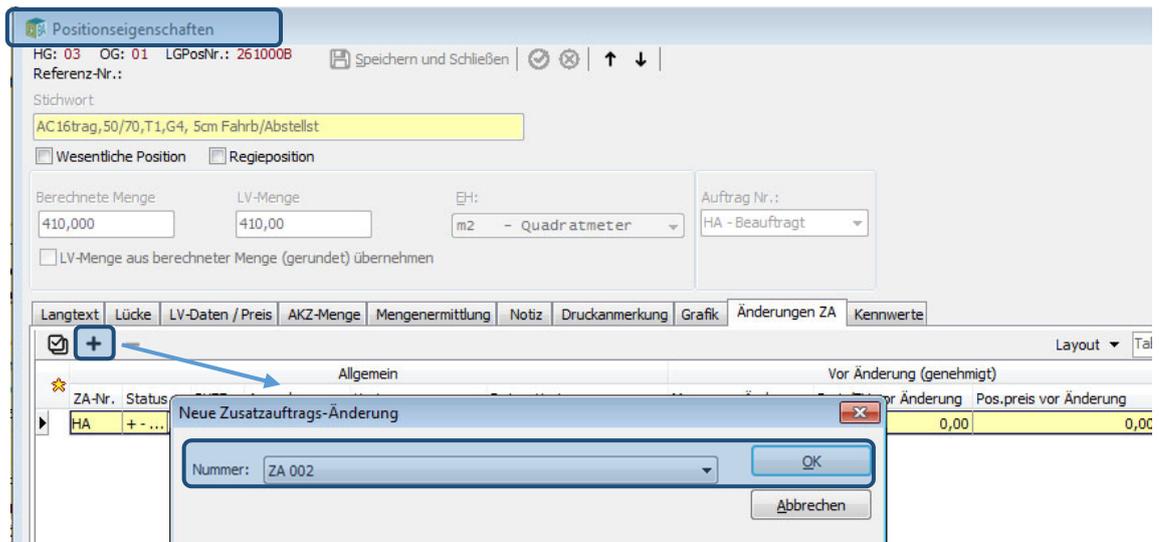

Positionseigenschaften
HG: 03 OG: 01 LGPosNr.: 261000B | Speichern und Schließen | [OK] [X] [↑] [↓]
Referenz-Nr.:
Stichwort: AC16trag,50/70,T1,G4, 5cm Fahrb/Abstellst
 Wesentliche Position Regieposition
Berechnete Menge: 410,000 LV-Menge: 410,00 EH: m2 - Quadratmeter Auftrag Nr.: ZA 002 - Gefordert
 LV-Menge aus berechneter Menge (gerundet) übernehmen

Langtext | Lücke | LV-Daten / Preis | AKZ-Menge | Mengenermittlung | Notiz | Druckanmerkung | Grafik | Änderungen ZA | Kennwerte

Kalkulieren...

Allgemein		Vor Änderung (genehmigt)					Änderung				
ZA-Nr.	Status	PVZZ	Anmerk.	Vertrag	Datum	Menge vor Änderun	Preis/EH vor Ände	Pos.preis vor Än	Diff. Menge	Diff. Lo/EH	Diff. So/EH
HA	+ ...					0,00	0,00	0,00	410,00	3,24	7,22
002	? ...					410,00	10,46	4.283,60	50,00		

Der „Status“ ist für die neu angelegte Zeile des ZA ebenfalls automatisch auf „beantragt“ und kann an dieser Stelle auch geändert werden, z. B. auf „genehmigt“ wenn die Mengenmehrung/-minderung schon geprüft ist.
Zur Änderung des „Status“ von gesamten Zusatzaufträgen bzw. einzelnen ZA-Positionen siehe Punkt 4.

Anmerkung: Bei der Vertragsfortschreibung von Hauptauftrags-LV-Positionen ist grundsätzlich kein Differenzpreis bei Lohn und Sonstigem anzugeben.


Diese Funktion ist für jene Fälle gedacht, wo eine Einheitspreisanpassung infolge z. B. der ÖNorm B2110 / B2118 „20 % Mengenklausel“, vereinbart wurde und die direkt in der Hauptauftrag LV-Position erfolgen soll.

Achtung: Sobald bei Lohn und/oder Sonstigem ein Differenzbetrag im ABK eingegeben wird, werden ALLE IN DIESER POSITION ABGERECHNETEN MENGEN mit dem NEUEN EINHEITSPREIS vergütet.

Beispiel: Erfassen von „neuen“ Positionen

Nachdem die HG 80 und OG 02 für den Zusatzauftrag im Unterordner „Gliederung“ bereits angelegt wurde, können auch „neue“ MKF-LV-Positionen angelegt werden. Für die HG 80 OG 02 wurde LB-VI 004 hinterlegt, aus der nun Standardleistungspositionen für den MKF entnommen werden.

Durch Aktivierung der folgenden Buttons erhält man in der Bildschirmansicht z. B. folgende Register „Leistungsbeschreibung“, „Referenz-LV“ und „Freiformulierte Positionen“, aus der man Positionen für den Zusatzauftrag „suchen“ und auswählen kann.

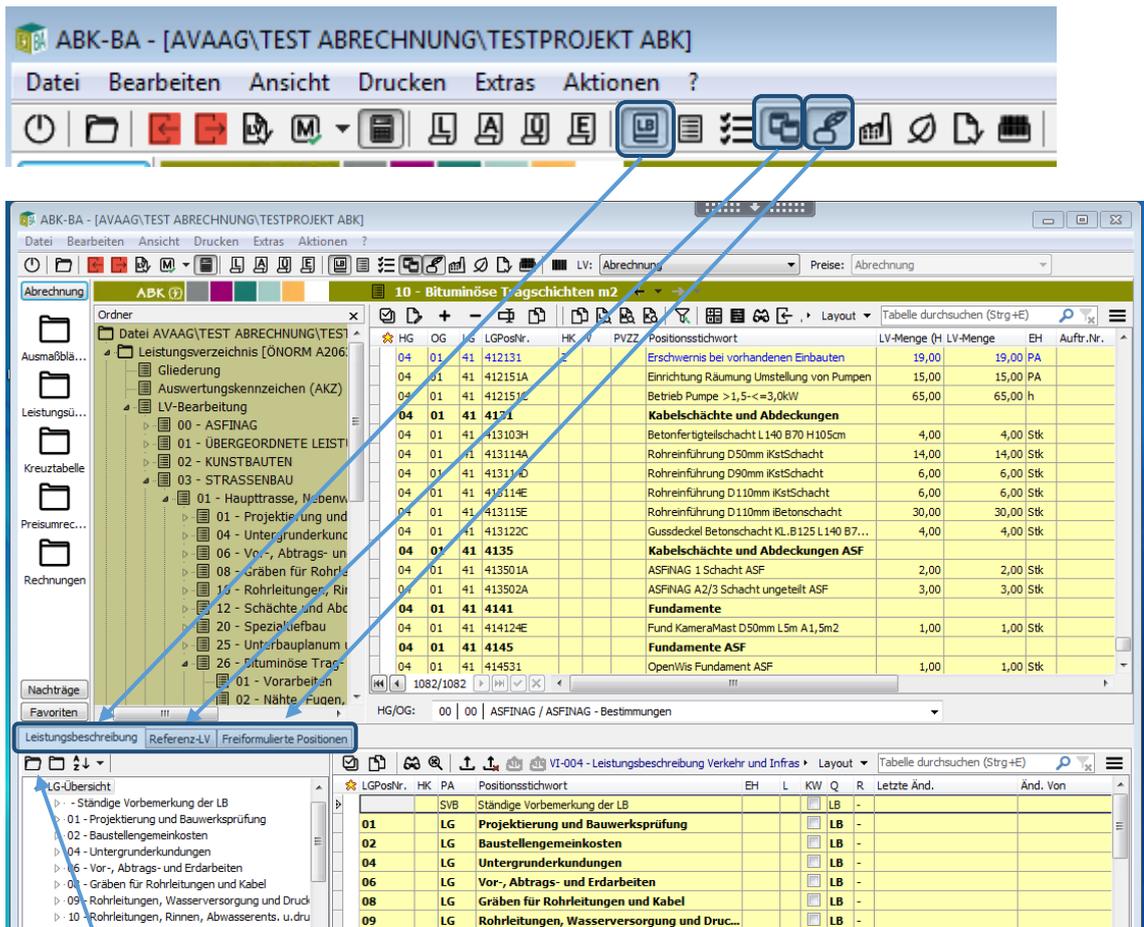

Im jeweiligen Register, z. B. in diesem Fall im Register „Leistungsbeschreibung“ kann mit dem Button „“ nach der erforderlichen „Datenquelle“ (im konkreten Beispiel LB-VI 004) gesucht und diese ausgewählt werden. Im darunterliegenden Fenster werden dann sämtliche LG sowie rechts daneben die Positionen der ausgewählten Standard-LB angezeigt.

Damit die benötigte Standard-LB-Position in der korrekten HG bzw. OG im Leistungsverzeichnis zugeordnet wird, muss diese zunächst Feld „HG/OG“ eingestellt werden. Die benötigte Position der Standard-LB mit „Doppelklick“ auswählen und dem ZA zuordnen.

Einstellung der HG und OG für neue MKF-Position

Hier wird die aktuell geöffnete LB nochmals angeführt

LGPosNr.	HK	PA	Positionstichwort	EH	L	KW	Q	R	Letzte Änd.
2613	ULG		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2						
261300A	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2					
261300B	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2					
261300C	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2					
261300D	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2					
261302A	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2					
261302B	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2					
261302C	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2					
261302D	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2					
261303A	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2					
261303B	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2					
261303C	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2					
261303D	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2					
261305A	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2					
261305B	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2					
261305C	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2					
261305D	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 8cmFahr/Abst	m2					
261305E	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 9cmFahr/Abst	m2					

HG/OG: 80 | 02 | Mehr-/Minderkostenforderungen / MKF 02

VI-004 - Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastrukt

Neue Zusatzauftrags-Änderung

Nummer: ZA 002

OK

Abbrechen

LGPosNr.	HK	PA	Positionstichwort	EH	L	KW	Q	R	Letzte Änd.	Änd. Von	G	ÄU	Vers.	Vorherige Pos.	S
2613	ULG		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2								G			4 1613	
261300A	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2							G			4 161300A	
261300B	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2							G			4 161300B	
261300C	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2							G			4 161300C	
261300D	GP		AC16binder,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2							G			4 161300D	
261302A	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2							G			4 161302A	
261302B	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2							G			4 161302B	
261302C	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2							G			4 161302C	
261302D	GP		AC16binder,PmB25/55-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2							G			4 161302D	
261303A	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 4cmFahr/Abst	m2							G			4 161303A	
261303B	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2							G			4 161303B	
261303C	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2							G			4 161303C	
261303D	GP		AC16binder,PmB25/55-55,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2							G			4 161303D	
261305A	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst	m2							G			4 161305A	
261305B	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	m2							G			4 161305B	
261305C	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	m2							G			4 161305C	
261305D	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 8cmFahr/Abst	m2							G			4 161305D	
261305E	GP		AC22binder,PmB45/80-65,H1,G4, 9cmFahr/Abst	m2							G			4 161305E	

Nach Bestätigung des ZAs gelangt man automatisch in das „Positionseigenschaften“-Fenster wo die Mengen im Feld „Diff. Menge“ sowie die neuen Einheitspreisanteile Lohn / Sonstiges in den Feldern „Diff. Lo/EH“ und Diff. So/EH“ einzugeben sind.

Langtext | Lücke | LV-Daten / Preis | AKZ-Menge | Mengenermittlung | Notiz | Druckenmerkung | Grafik | Änderungen ZA | Kennwerte

Kalkulieren...

Layout | Tabelle durchsuchen (Strg+E)

ZA-Nr.	Status	VZ	Anmerk.	Vertrag	Datum	Menge vor	Änz	Preis/EH vor	Pos. preis vor	Änz	Diff. Menge	Diff. Lo/EH	Diff. So/EH	Diff. Preis/EH	Differenzbetrag
002	?					0,00					50,00	5,00	14,50		19,50

ZA 002


Mengen- und Preisentwicklung

Anerkannt bisher	Anerkannt bisher ZA 002	ZA 002	Pos. Preis HA	HA+ZA genehmigt	HA+ZA
Menge:	0,00	0,00	EHP:	0	EHP:

Weiter >

Das „Auswertungskennzeichen (AKZ)“, dem die Position zugeordnet werden soll, ist zu definieren und mit „Weiter >“ zu bestätigen.

Im Registerblatt „LV-Daten/Preis“, ist der Leistungsteil (LT) für die Preisumrechnung zuzuordnen. Mit dem Button „Fertig“ ist das Anlegen der neuen Position im LV abgeschlossen.

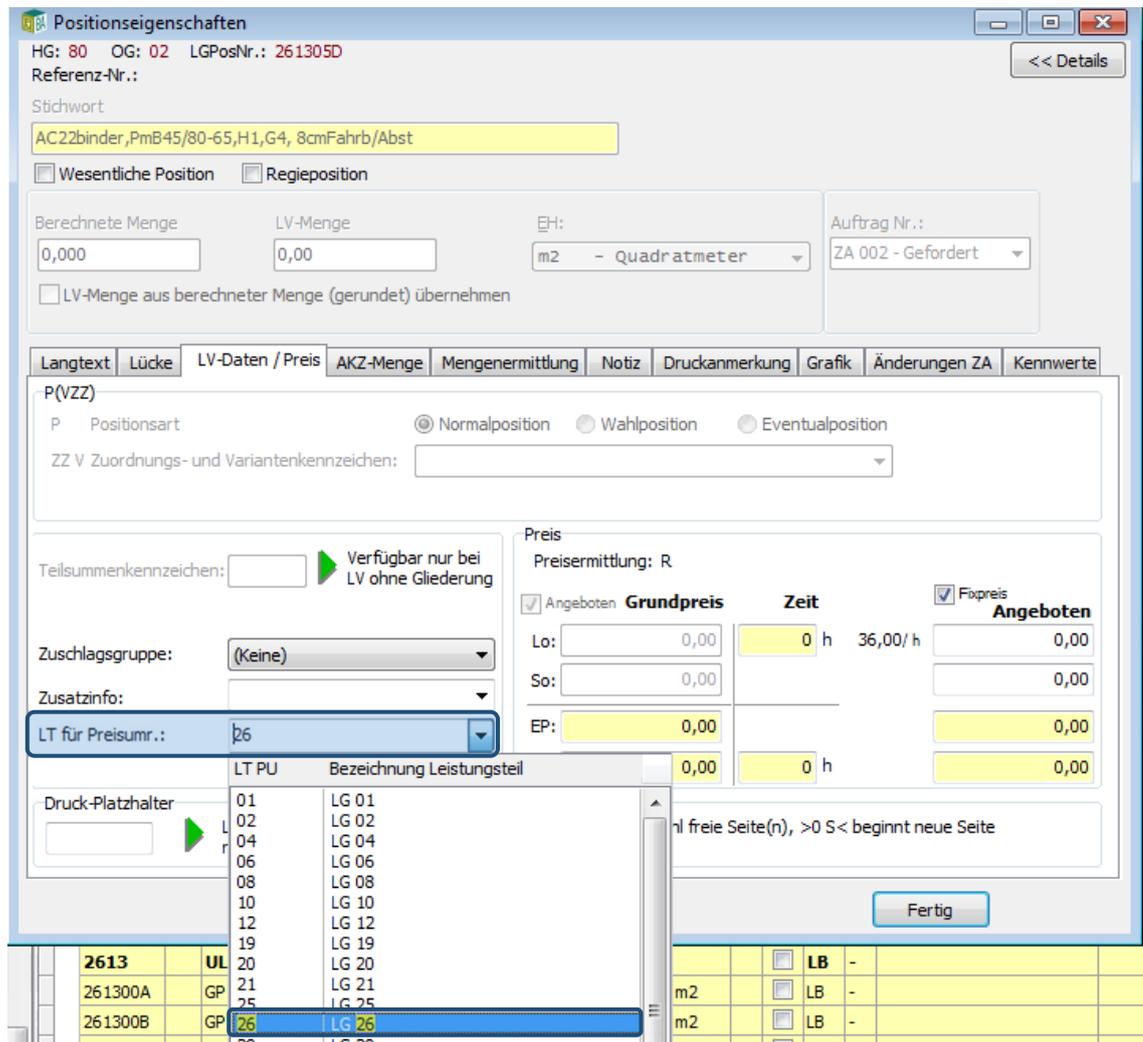

Die „neue“ Position erscheint im LV und da im gegenständlichen Beispiel der „Status“ auf „beantragt“ voreingestellt wurde, ist die Position in kursiver Schrift und Menge 0,00 dargestellt. Da es sich um eine Standard-LB Position handelt, werden auch Kurz-, Langtext und die Vorbemerkungen der LG sowie ULG angelegt und übernommen.

LV-Bearbeitung	00 - ASF IN AG	01 - ÜBERGEORDNETE LEISTUNG	02 - KUNSTBAUTEN	03 - STRASSENBAU	04 - CNAS	80 - Mehr-/Minderkostenforderung	Abbildungenverzeichnis	Varianten	Nachlässe/Aufschläge	Bieterlücken	LV-Versionen	Erweiterte Preisermittlung	Aufträge	Abrechnung
	04	01	41	413502A										
	04	01	41	4141										
	04	01	41	414124E										
	04	01	41	4145										
	04	01	41	414531										
	04	01	41	4155										
	04	01	41	415531A										
	04	01	41	415531D										
	04	01	41	415531E										
	04	01	41	415541										
	04	01	41	4175										
	04	01	41	417501A										
	04	01	41	4191										
	04	01	41	419101										
	80	01	27	27										
	80	01	27	2735										
	80	01	27	273501A										
	80	01	27	273501B										
	03	01	26	261000B										
	80	02	26	26										
	80	02	26	2613										
	80	02	26	261305D										

Sobald der „Status“ der Position auf „genehmigt“ geändert wird (durch Doppelklick der Position und Änderung im „Positionseigenschaften“-Fenster (siehe auch Punkt 4.1.2.2), wird auch die Menge angezeigt und die kursive Schrift verschwindet.

80	01	27	27			Kabel					001				LB
80	01	27	2735			Lichtwellenleiterkabel ASF					001				LB
80	01	27	273501A			LWL-Kab ASFINAG 1 Backbone ASF	0,00	1.000,00	m		001	+		89	LB
80	01	27	273501B			LWL-Kab ASFINAG 2 Lokaldienst ASF	0,00	0,00	m		001	-		89	LB
03	01	26	261000B			AC16trag, 50/70,T1,G4, 5cm Fahrb/Abstellst	410,00	460,00	m2		002	+		26	LB
80	02	26	26			Bituminöse Trag- und Deckschichten					002				LB
80	02	26	2613			Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichte...					002				LB
80	02	26	261305D			2binder,PmB45/80-65,H1,G4, 8cm Fahrb/Abst	0,00	50,00	m2		002	+		26	LB

4 „Status“ von Zusatzaufträgen


4.1.1 Bedeutung von „Status“ für Abrechnungsprüfung

Es gibt 3 „Status“-Einstellmöglichkeiten im ABK.

- beantragt
- genehmigt
- abgelehnt


Auswirkungen auf Abrechnung:

- Status „beantragt“:
Solange sich ein Zusatzauftrag bzw. einzelne Positionen aus einem Zusatzauftrag im Status „beantragt“ befindet bzw. befinden, erfolgt die Berechnung mit Einheitspreis „Null“.



Auftragsnummer	Status	Datum	Nummer Rechnungsw.	Auftragsbezeichnung	Summe LV (ohne N/A)	Nachlässe/Aufschläge	Netto	Steuer Gesamt	Brutto
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt	17.246.335,21	0,00	17.246...	3.449.267,04	20.695...
ZA 001	Beantragt	07.08.2019		Testprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Status „genehmigt“:
Sobald sich ein Zusatzauftrag bzw. einzelne Positionen aus einem Zusatzauftrag im Status „genehmigt“ befindet bzw. befinden, erfolgt die Berechnung mit geprüften Einheitspreis(en) und Menge(n).



Auftragsnummer	Status	Datum	Nummer Rechnungsw.	Auftragsbezeichnung	Summe LV (ohne N/A)	Nachlässe/Aufschläge	Netto	Steuer Gesamt	Brutto
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt	17.246.335,21	0,00	17.246...	3.449.267,04	20.695...
ZA 001	Ganzer ZA genehmigt	07.08.2019		Testprojekt	62.000,00	0,00	62.000...	12.400,00	74.400...

- Status „abgelehnt“:
Zusatzauftrag bzw. einzelne Positionen aus einem Zusatzauftrag im Status „abgelehnt“ können, wie der Name schon verdeutlicht, nicht abgerechnet werden bzw. werden nicht abgerechnet.



Auftragsnummer	Status	Datum	Nummer Rechnungsw.	Auftragsbezeichnung	Summe LV (ohne N/A)	Nachlässe/Aufschläge	Netto	Steuer Gesamt	Brutto
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt	17.246.335,21	0,00	17.246...	3.449.267,04	20.695...
ZA 001	Abgelehnt	07.08.2019		Testprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4.1.2 Änderung des „Status“ von einzelnen Zusatzauftragspositionen bzw. ganzen Zusatzaufträgen

Der Status kann sowohl gesamtheitlich für alle Zusatzauftrags-Positionen, als auch im Leistungsverzeichnis für jede Zusatzauftragsposition einzeln, geändert werden.

4.1.2.1 Gesamtheitliche Änderung des „Status“ eines Zusatzauftrags

Dazu den zu ändernden ZA markieren und entweder

- über den Button „“ oder
- rechte Maustaste und „Status ändern...“ auswählen.

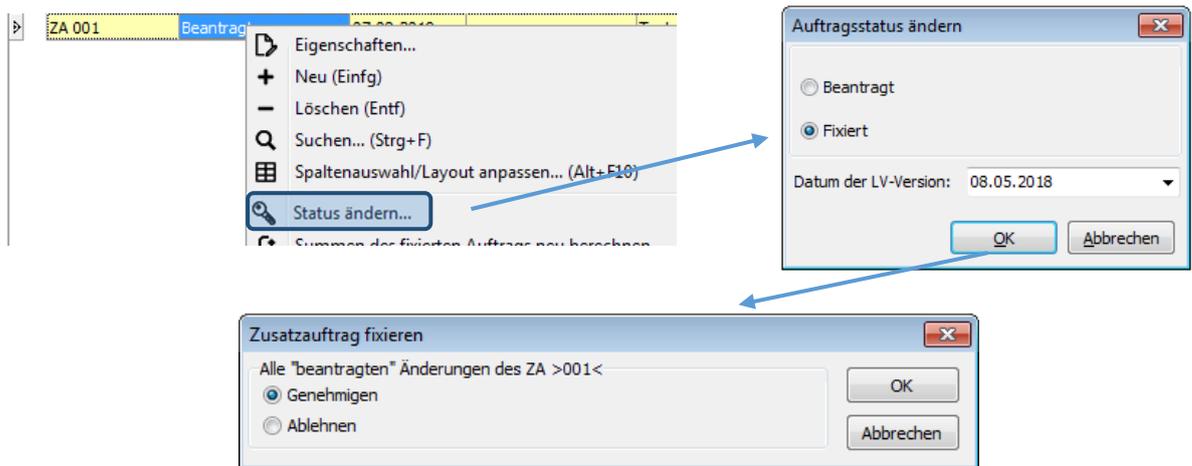


Anschließend z. B. „Fixiert“ auswählen und danach kommt zumindest beim „ersten“ gesamtheitlichen Statuswechsel die Frage, ob gesamtheitlich „genehmigen“ oder „ablehnen“ gewünscht ist. Mit „OK“ die Auswahl bestätigen.

4.1.2.2 Änderung des „Status“ auf Positionsebene für ZA-Positionen

Ist keine gesamtheitliche Statusänderung möglich oder gewünscht, kann im „Register“ „LV-Bearbeitung“ unter der Spalte „Auftr.Nr.“ auch nach dem ZA gefiltert werden und anschließend der Status der einzelnen Positionen geändert werden.

HG	OG	LG	LGPosNr.	HK	V	PVZZ	Positionstschwort	LV-Menge (H)	LV-Menge	EH	Auftr.Nr.	Status
80	01	27	27				Kabel				001	001
80	01	27	2735				Lichtwellenleiterkabel ASF				001	001
80	01	27	273501A				LWL-Kab ASFINAG 1 Backbone ASF	0,00		0,00,m	001	?
80	01	27	273501B				LWL-Kab ASFINAG 2 Lokaldienst ASF	0,00		0,00,m	001	?

Mit Doppelklick auf die Position gelangt man in das Fenster „Positionseigenschaften“ und dort kann der „Status“ der Position geändert werden.

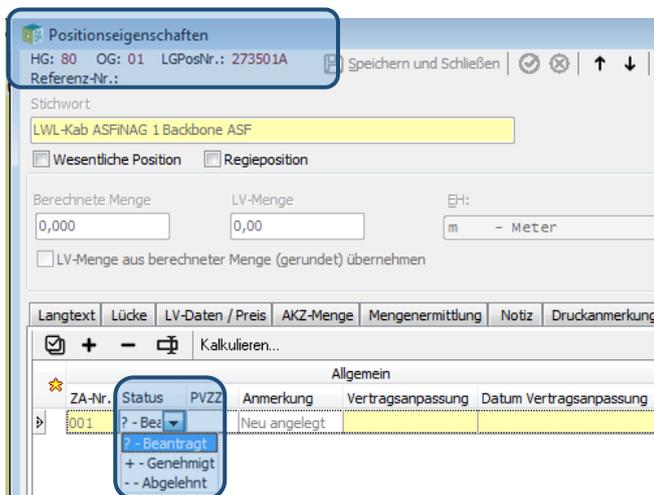

Für diesen beispielhaften ZA wurde die erste ZA-Position auf „genehmigt“ und die zweite auf „abgelehnt“ gesetzt.

HG	OG	LG	LGPosNr.	HK	V	PVZZ	Positionsstichwort	LV-Menge (H)	LV-Menge	EH	Auftr.Nr.	Status	W
80	01	27	27				Kabel				001		
80	01	27	2735				Lichtwellenleiterkabel ASF				001		
80	01	27	273501A				LWL-Kab ASFINAG 1 Backbone ASF	0,00	1.000,00	m	001	+	
80	01	27	273501B				LWL-Kab ASFINAG 2 Lokaldienst ASF	0,00	0,00	m	001	-	

Wenn man dann im Register „Aufträge“ den ZA über den Button „“ neu berechnen lässt, ergibt sich für das Beispiel ZA 001 folgendes Ergebnis.

Auftragsnummr	Status	Datum	Nummer Rechnungsw.	Auftragsbezeichnung	Summe LV (ohne N/A)	Nachlässe/Aufschläge	Netto	Steuer Gesamt	Brutto
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt	17.246.335,21	0,00	17.246...	3.449.267,04	20.695...
ZA 001	Beantragt	07.08.2019		Testprojekt	30.000,00	0,00	30.000...	6.000,00	36.000...

Abschließend erfolgt über den Button „“ im Register „Aufträge“ noch eine Statusänderung für alle noch auf „beantragte“ gestellte Positionen, deren Status nicht auf Positionsebene geändert wurde.


Für dieses Beispiel mit einer Position „genehmigt“ und einer „abgelehnt“ erscheint danach im Feld Status „ZA teilgenehmigt“.

Auftragsnummr	Status	Datum	Nummer Rechnungsw.	Auftragsbezeichnung	Summe LV (ohne N/A)	Nachlässe/Aufschläge	Netto	Steuer Gesamt	Brutto
HA	Fixiert	08.11.2018		Testprojekt	17.246.335,21	0,00	17.246...	3.449.267,04	20.695...
ZA 001	ZA Teilgenehmigt	07.08.2019		Testprojekt	30.000,00	0,00	30.000...	6.000,00	36.000...

5 MKF-Datenträger erstellen/exportieren

Zum Erstellen / Exportieren eines „Vertragsanpassungs-LV“ entweder

- Menü „Datei“ „ Zusatzangebot/Vertragsanpassung exportieren...“ oder
- im Register „Aufträge“ auf den Button „“ oder
- rechte Maustaste „ Zusatzangebot/Vertragsanpassung exportieren...“.

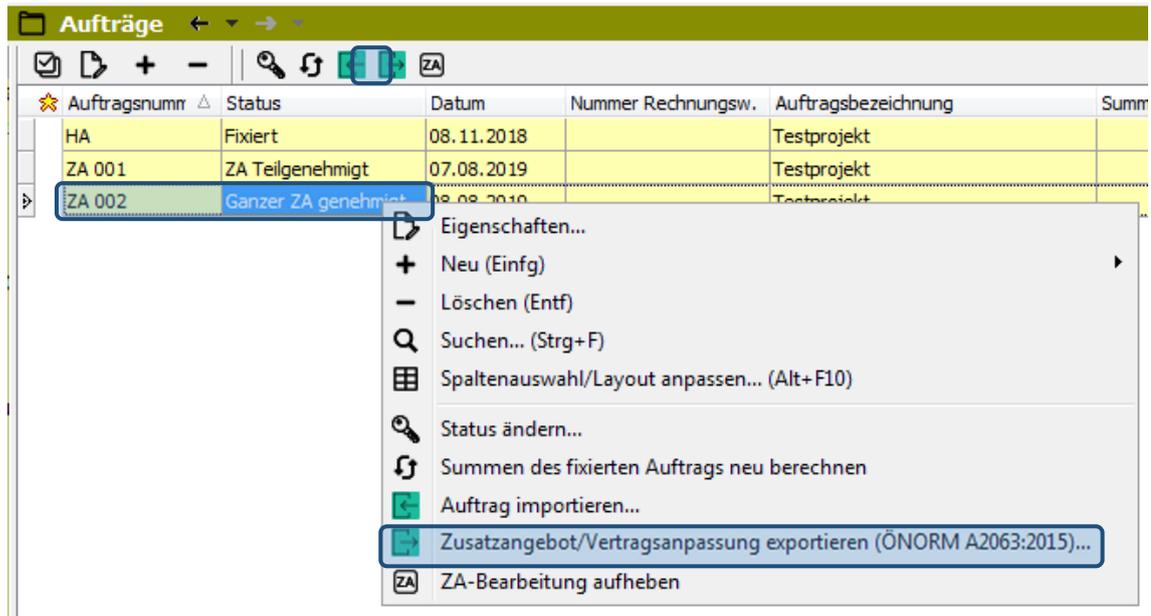

Sofern nicht schon im Vorfeld erfolgt, wird spätestens hier eine LV-Prüfung durchgeführt. Wichtig ist, dass das Häkchen bei „Vertragsanpassungs-LV“ gesetzt, der entsprechende ZA ausgewählt und im nächsten Schritt der Speicherort, wohin der Zusatzauftrag exportiert werden soll, angegeben wird. Danach kann der Export abgeschlossen werden.

Anmerkung: Ein „Vertragsanpassungs-LV“ kann nur für zur Gänze „genehmigte“ oder zur Gänze „abgelehnte“ Zusatzaufträge erstellt, sprich exportiert werden.

Empfehlung Team Abrechnung:

Sollte es im Zuge der MKF-Prüfung zu einer Ablehnung einzelner MKF-Positionen eines ZA kommen, so sollen im ABK nur der geprüften und beauftragten Leistungen des Zusatzauftrags eingepflegt werden.

Seitens ÖBA ist für den „genehmigten“ Zusatzauftrag auf Basis des eingereichten Datenträgers jedenfalls ein „Vertragsanpassungs-LV“ zu erstellen und dem AN zu übergeben.
